

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalínové cesty


Číslo zprávy:	21/2025
Datum vystavení zprávy:	29. 4. 2025
Datum provedení kontroly spalínové cesty:	29. 4. 2025
Jméno a příjmení způsobilé osoby/název firmy:	David Sedlařík
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	MMOP 96791/2019
IČ odborně způsobilé osoby, podnikatele:	08408513
Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, příp. jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:	Základní škola Školní 58, Branka u Opavy
Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:	
Základní údaje o spotřebiči paliv:	dva plynové kotle BAXI LUNA DUO-TEC umístěny ve sklepě
Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena kontrola:	Kotle jsou zapojeny společným PVC kouřovodem na zděný komínový průduch dodatečně vyvložkovaný PVC vložkou o $\varnothing$ 125 mm, ukončený ve sklepě patním kolenem.
Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici):	207/2016
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:	--
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:	--
Termín odstranění nedostatků:	--

ZÁVĚR

Spalínová cesta pro další provoz

VYHOVUJE

podpis a razítko oprávněné osoby

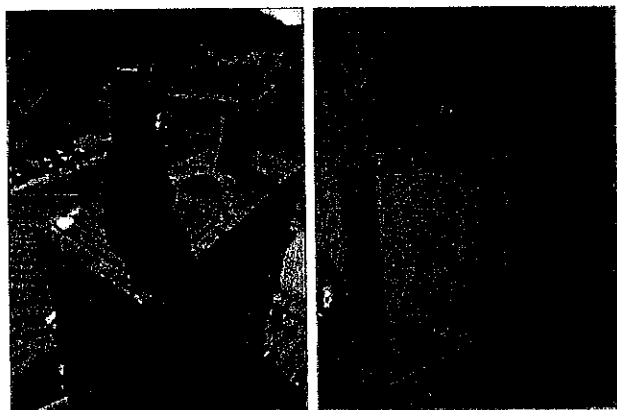

David SEDLAŘÍK
KOMINICTVÍ

Na Bahně 20, 747 05 Opava 5
731 715 620, IČ: 08408513

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle zákona č. 250/2021 sb. a NV č. 191/2022 sb.

Ev. č. 194/2025

Datum provedení revize: 30. 09. 2025

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu) ZŠ Branka u Opavy Školní 58 747 41 Branka u Opavy	
Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení, oprávnění Ing. Jan Melecký č. osv. 27753/7/22- R – PZ – f, g č. opr. 2723/25/PZ-M, R-F1,F2,G1,G2,G3	

Druh revize: PROVOZNÍ

Označení zařízení (předmět revize): STL HUP, NTL domovní plynovod,
včetně kotlů Baxi,
včetně funkčního odzkoušení.

Druh zařízení: F, G

Za provozovatele se zúčastnil: p. Špička

Celkové zhodnocení zařízení: **Je způsobilé bezpečného provozu.**

Zpráva obsahuje ...2.....stran.

V Kravařích 30. 09. 2025

Rozdělovník:

1 x provozovatel

1 x montážní firma



.....
Podpis a razítko revizního technika

ZÁPIS O ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ODBĚRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Místo: ZŠ Branka u Opavy, Školní 58, Branka u Opavy

Datum: 30. 09. 2025

Spotřebiče: 2ks kotlů Baxi Luna Duo-Tec MP + 1.35, výkon 2 x 35 kW, provedení C

Jedná se o kondenzační kotle, v provedení C.

Bylo provedeno odpojení elektroinstalace, provedena demontáž hořáku, demontáž a vyčištění zapalovací a ionizační elektrody, sifonu, vyčištění povrchu hořáku. Kontrola a vyčištění kotlového tělesa.

U obou kotlů provedena výměna těsnění příruby hořáku (malá příruba).

Zpětná montáž všech částí a zapojení elektroinstalace.

Najetí kotle, kontrola seřízení startovacího a jmenovitého výkonu.

Kontrola seřízení dle měření spalín.

Celkové odzkoušení, včetně zabezpečovacích prvků, kontrola nastavení.

Kontrola a odzkoušení provozního, havarijního termostatu, hlídání plamene-ionizace, bez závad.

Kontrola těsnosti všech plynových spojů u spotřebičů, v pořádku.

Plynové spotřebiče jsou schopné bezpečného provozu.

V Kravařích 30. 09. 2025

Ing. Jan MELECKÝ
Montáže, opravy, revize
a zkoušky plynových zařízení
ev. č. opr. 7259/748/PZ-M, R-f, g
Novodvorská 57, 747 21 Kravaře
tel.: 604 102 238

BAXI LUNA DUO-TEC MP+1.35
ZŠ BRANKA
KOTEL-Č-1

KOTEL-Č-2

testo310
V5.4 42876238/4
PLYNOSERVIS MELECKÝ
604 102 238
Phone _____
30. 9. 2025 13:57:30
Fuel Natural gas
CO2max 11.9%
24.9°C Fluegas Temp
5.7% O2
21ppm CO
0.5% qA
29ppm Undiluted CO
8.61% CO2
15.1°C Ambient Temp
99.5% EFF
109.4% EFF*
1.38 Lambda
-hPa Draught
-hPa Diff. Press
-ppm Ambient CO

testo310
V5.4 42876238/4
PLYNOSERVIS MELECKÝ
604 102 238
Phone _____
30. 9. 2025 13:59:36
Fuel Natural gas
CO2max 11.9%
35.3°C Fluegas Temp
5.9% O2
47ppm CO
1.0% qA
66ppm Undiluted CO
8.56% CO2
15.1°C Ambient Temp
99.0% EFF
106.9% EFF*
1.39 Lambda
-hPa Draught
-hPa Diff. Press
-ppm Ambient CO

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 - B. Údaje o měření a zkouškách.
 - C. Zjištěné závady a nedostatky. Návrh opatření a lhůt k odstranění.
 - D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
 - E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
-

A.

Jedná se o NTL domovní plynovod, ukončený kul. uzávěry před spotřebiči, včetně. Jde o rozvod a spotřebu plynu spalováním.

Ve výklenku obvodové zdi školy je výstup STL přípojky, HUP KK DN25, regulátor tlaku, kuž. kohout DN40. Přes zeď do sklepa vchází DN40-1m, následuje vnitřní plynovod sklepem v DN40-1,5m. Následuje KK DN40, plynoměr a rozvod sklepem v DN40-2m a ukončen je odvodňovací zátkou. Z DN40 je odbočka DN32-20m, sběrač DN80-2m a ukončen je zavařením. Z DN80 jsou dvě krátké odbočky DN20, KK DN20 a přes nerezové vlnovce jsou připojeny dva kotle Baxi Luna Duo-Tec MP + 1.35, o výkonu 2 x 35 kW, provedení C. Plynovod je zhotoven z černých, ocelových, bezešvých trubek, přednostně svařovaný, upevněný na konsolách a natřen. Při průchodu nosnými zdmi je opatřen chráničkami a ochrannou trůbkou.

B.

Celé plynové odběrní zařízení bylo podrobena zkoušce provozuschopnosti, těsnost všech závitových spojů byla kontrolována přístrojem na únik plynu GI 03 M. Pevnost byla kontrolována poklepem a vizuálně. Těsnost byla taky zjišťována kontrolním odečtem na plynoměru, při odstavených spotřebičích. Samotné spotřebiče jsou podrobovány pravidelným, ročním, servisním prohlídkám. Zároveň provedena zkouška funkčnosti zabezpečovacích prvků, kontrola a odzkoušení havarijního a spalínového termostatu, kontrola hlídání plamene-ionizace, bez závad. Zkouška uzavíracích a ovládacích armatur na zařízeních.

C.


Bez závad.

D.

Žádné.

E.

Byla předložena revize komínu, Valchař Vlastimil, č. osv. 004/36-024/2010.



Zpráva o revizi hromosvodu

Organizace:	OBEC Branka
Objekt :	budova ZŠ
Pravidelná revize Byla provedena dle ČSN 33 1500 v souladu s ČSN 34 1390 Zahájena dne: 27.8.2025 ukončena dne 27.8.2025 Rev.tech. Karel POSPIECH ev. číslo: 2555/24/R-EZ-E2A Luční 7 Opava 5 tel. 604743996 ev.č.opr. 8922/25/EZ-M,O,R,Z-E2A	
Celkový posudek: Hromosvodové zařízení je zhotoveno a revidováno podle ČSN 34 1390 a vyhovuje	
Upozornění provozovateli – uživatel : 1.Zpráva o revizi je pro provozovatele – uživatele zařízení závazná k ČSN 33 2000 musí být zjištěné závady v ní odstraněny ve stanovených termínech v souladu s platnými ČSN a předpisy tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku 2.Provozovatel – uživatel zajistí provedení pravidelné revize v termínu uvedeném v této revizní zprávě dle ČSN 33 1500 a po každém zjištěném zásahu blesku zajistí provedení mimořádné revize dle ČSN.EN 62 305-1 až 4 ed.2 3. příští revize dle ČSN 33 1500 v roce 2029/	
Soupis zjištěných závad: Při výměně střešní krytiny proveďte montáž hromosvodu dle ČSN 62 305-1 až 4 ed.2	
Výkres : bez výkresové dokumentace	

Tato zpráva má 2 strany
Počet vyhotovení zpráv: 2x

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x RT

vypracováno dne 2.9.2025
předáno: dne 4.9.2025

podpis objednatele



podpis rev.technika

Počasí v posledních třech dnech : oblačno,sucho

teplota : 25°C

Okolní půda : jíl,trávník

Budova : budova zděná vícepodlažní

Střecha: valbová

Krytina:

Jímací vedení: FeZn 8mm

Vedení v zemi:drát FeZn 10mm

Počet svodů: 3

Počet jímačů: 1TA+ 2PJ

Kovové hmoty jsou napojeny na hromosvodovou soustavu

Měření svodů :

Naměřené hodnoty jsou uvedeny včetně chyby měřícího přístroje uvedeného výrobcem.

svod číslo

naměřené hodnoty

(název)

v Ohmech

zemnič č 1.....	15 ohmů	Rp=0,03 ohmů
zemnič č.2.....	9	Rp=0,03
<u>zemnič č.3.....</u>	<u>8,6</u>	<u>Rp=0,03</u>

Rv=8,5

Použité měřící přístroje : EASY TEST č. 98054209 dat.kalibrace 27.8.2024

Klešťový měř.přístroj Kiuritsu vč.1113563

ZÁVĚR

Revize byla provedena v souladu s požadavky technických předpisů a norem
v době realizace budovy a uvedené ČSN 34 1390 vyhovuje

Konec zprávy

Zápis o kontrole hasicích přístrojů

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Objednavatel kontroly (vlastník/uživatel hasicího přístroje)		Zhotovitel kontroly:	
Název (jméno, příjmení)	Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace		
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Školní 58 747 41 Branka u Opavy		
I Č:	70999651		
Kontaktní osoba			

Adresa objektu, kde jsou HP instalovány		Základní škola - Branka u Opavy			Číslo zápisu	1	Strana / počet stran	1 / 1		
č.	Umístění	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	T.Z / náhr. díly	Výsledek kontroly HP		
								Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1.	Chodba 3. NP	PR	KO	6PKT	09217 / 039186	05 / 25	20 / 25		C	nový GP6
2.		PR	KO	6PKT	210914	06	21			x
3.		PR	KO	6PKT	31039	06	21			x
4.	Chodba 2. NP	PR	KO	6PKT	307403 / 039281	05 / 25	20 / 25		C	nový GP6
5.		PR	KO	6PKT	366773	07	22			x
6.	počítačová učebna	CO	KO	2SKT02	00625	00	23			x
7.	chodba 1. NP	PR	KO	6PKT	408155	05	22			x
8.	jídlna	PR	GAZ	GP6	037455	23	23			x
9.	plynová kotelná	CO	E	CO26/L	01067	98	21			x
10.		PR	H	P6TE	026904	17	22			x
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										


Jiné závady a doporučení:


Vysvětlivky značek									
Druh hasicího přístroje		Výrobce hasicího přístroje		Výměna náhradních dílů		Důvod odeslání HP na údržbu		Důvod vyřazení HP	
V	vodní	N	Neuruppin	TS	typový štítek	1	provedení periodické zkoušky	A	vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN	pěnový	H	Hastex Haspr	H	hadice/tryska			B	nelze bezpečně zjistit výrobní číslo, rok výroby
PR	příškový	K	Kodreta	M	manometr	2	poškozená nádoba		
CO	oxid uhličitý	T	Tepostop	NA	nárazníková armatura	3	nevyhovující náplň		
		P	Pyrokontrol	TP	tlaková patrona	4	poškozené, vadné, chybějící komponenty	C	HP starší 20 let, HP CO2 starší 40 let
		B	Bavaria	NV	návrlek				
		A	Albeco	MT	membrány / těsnění	5	plnění po použití		
		E	ETS Ostrava	PO	pojistka				
		KO	Kovoslužba	DM	ostatní drobný materiál			x	Hasicí přístroj vyhovuje, provozuschopný HP
		G	Gloria	TZ	tlak. zkouška provedena				

Poučení: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. od 1.1.2002 dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) hasicího přístroje ve smyslu ustanovení § 9 vyhl. 246/2001 Sb.

Vykonavatel potvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce HP.

Datum provedení kontroly Říjen 2025	Jméno a příjmení oprávněné osoby: Gebauer Radek
	
Servis požární ochrany Hlavní 177, Dolní Životice 747 56 IČ: 10923756 DIČ: CZ10923756 e-mail: info@hasicakymajewski.cz	
Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce	Za vykonavatele - podpis oprávněné osoby



Hlavní 177, Dolní Životice 747 56
IČ: 10923756, DIČ: CZ10923756
E-mail: info@hasicakymajewski.cz
Tel: 777029154, 608029155

ZPRÁVA

o kontrole požárních vodovodů dle ČSN 73 0873 a norem souvisejících

Objekt : ZŠ Branka u Opavy

Majitel : ZŠ a MŠ Branka u Opavy příspěvková org. Školní 58 747 41

Přílohy zprávy : A, B, závěr

Datum kontroly :

Říjen 2025

Kontrolu provedl : Gebauer Radek

Objekt : ZŠ Branka u Opavy

Majitel : ZŠ a MŠ Branka u Opavy příspěvková org.Školní 58 747 41

ZPRÁVA "A"

o kontrole přípojky, zdroje požární vody, požárního potrubí a vstupních
armatur požárního vodovodu dle ČSN 73 0873 a norem souvisejících

Projektovou dokumentaci vypracoval: xx Pod číslem : xx

Projekční firma : xx Datum zpracování : xx

V době kontroly byla projektová dokumentace k dispozici : není k dispozici

Hlavní uzávěr vody:

označen : ano trvale volně přístupný : není funkční : ano

Potrubí požárního vodovodu :

provedena ochrana tepelná : ano antikorozní : ano

proti hluku a vibracím : není potrubí trvale zavodněno : ano

Tlaková zkouška požárního vodovodu dle ČSN 73 6660 provedena dne : xx

Záznam o tlakové zkoušce : není již k dispozici

Na potrubí požárního vodovodu instalováno :

vnitřní odběrní místo - hydrantový systém "D" : ano počet : 2 ks

- hydrantový systém "C" : počet : není

vnější odběrní místo - nadzemní hydrant : počet : není

- podzemní hydrant : počet : není

Přetlaková stanice instalována : není

V objektu je instalováno požární potrubí (suchovod) počet : není

Zdroj požární vody : veřejný vodovodní řad

vodoměr : 10 požární obtok : není

redukční ventil : není zpětná klapka : není

odvodnění : ano

Objekt : ZŠ Branka u Opavy

Majitel : ZŠ a MŠ Branka u Opavy příspěvková org. Školní 58 747 41

ZPRÁVA - "ZÁVĚR"

z kontroly požárního vodovodu (zásobování objektu požární vodou)
a jeho příslušenství dle ČSN 73 0873 a norem souvisejících

Popis zjištěného stavu a provedené kontroly :

Požární vodovod byl překontrolován dle ČSN 73 0873. Rozsah kontroly a současný stav požárního vodovodu vyjadřuje předchozí zpráva.

NEDOSTATKY:

Kontrolou instalovaných požárních hydrantů nebyly zjištěny závady.
Jednotlivé hydranty jsou plně použitelné k hasebnímu zásahu.

Doporučení :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

HODNOCENÍ:

Závěrem provedené kontroly požárního vodovodu lze konstatovat,
že požární vodovod jako celek je bez závad a hydranty jsou použitelné k hasebnímu zásahu.

ODPOVÍDÁ

požadavkům souboru platných norem v oboru požární ochrany a norem souvisejících.
Platnost této závěrečné zprávy je 12 měsíců.



Datum kontroly :

Říjen 2025

Provedl :

Gebauer Radek
